



## PRINCE2® Foundation

Skuteczne zarządzanie projektami w sterowalnym otoczeniu

Spółka SPIN-US przy współpracy z firmą szkoleniową INPROGRESS zaprasza na akredytowane szkolenie mające na celu zdobycie wiedzy z zakresu metodyki efektywnego prowadzenia projektu

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.




## O NAS

**SPIN-US** Sp. z o.o. jest spółką celową Uniwersytetu Śląskiego. Podstawowy kierunek działań spółki SPIN-US stanowi komercjalizacja wyników badań naukowych, prac rozwojowych i technologii powstałych na Uniwersytecie Śląskim oraz transfer wiedzy z uczelni do gospodarki celem budowania współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu.

Nasze atuty:

- ♦ ścisła współpraca z Uniwersytetem Śląskim, co gwarantuje bazę ekspertów oraz wysoką jakość oferowanych usług i technologii
- ♦ budowanie przewagi konkurencyjnej na bazie innowacji
- ♦ profesjonalizm i szybkość działania

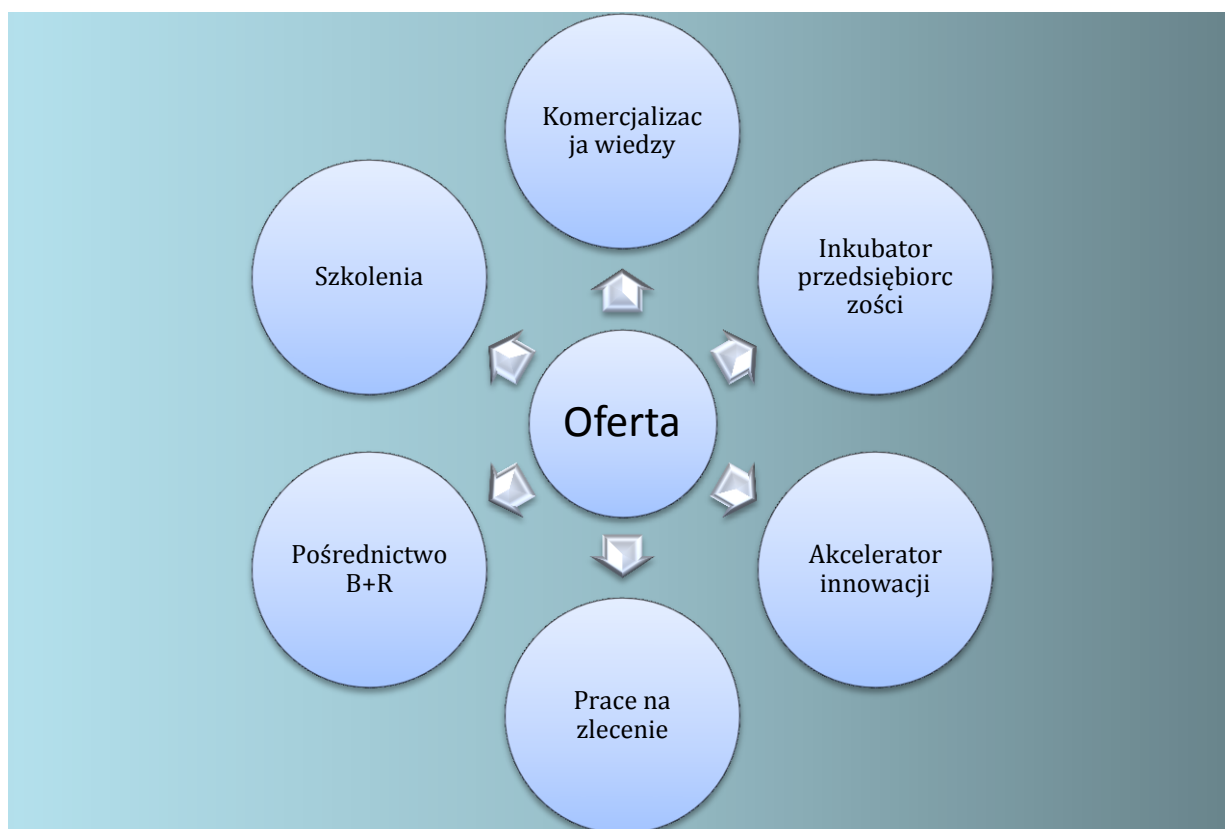

*Spółka SPIN-US: oferta usług*

# PLAN SZKOLENIA

Praca przedkursowa:

- ◆ Lektura „PRINCE2 Tour” oraz rozwiązanie ćwiczeń
- ◆ Rozwiązanie ćwiczenia – Puzzle
- ◆ Rozwiązanie ćwiczenia – Role
- ◆ Rozwiązanie ćwiczenia – Produkty
- ◆ Rozwiązanie ćwiczenia – Ryzyko
- ◆ Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu PRINCE2 Foundation
- ◆ Pierwszy próbny egzamin PRINCE2 Foundation wraz z wyjaśnieniami

Czas trwania	Temat – zawartość – numer modułu
<b>Dzień pierwszy</b>	
105 min	Moduł 1 – Przegląd metodyki PRINCE2: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawy organizacyjnej szkolenia i egzaminu</li> <li>• Przegląd metodyki PRINCE2</li> <li>• Prynypia metodyki PRINCE2</li> <li>• Pytania podsumowujące</li> <li>• Omówienie ćwiczenia – Puzzle (do realizacji samodzielnie przed szkoleniem)</li> </ul>
75 min	Moduł 2 – Temat Organizacja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeznaczenie Tematu Organizacja</li> <li>• Role i obowiązki</li> <li>• Struktura zespołu zarządzania projektem</li> <li>• Kontekst klient – dostawca (do samodzielnego przeanalizowanie – praca domowa)</li> <li>• Pytania podsumowujące</li> <li>• Omówienie ćwiczenia – Role (do realizacji samodzielnie przed szkoleniem)</li> </ul>
15 min	Przerwa
30 min	Moduł 3 – Proces Przygotowanie Projektu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cel, przeznaczenie i kontekst procesu</li> <li>• Zakres procesu Przygotowanie Projektu</li> <li>• Pytania podsumowujące</li> </ul>

## PRINCE2® - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

30 min	<p>Moduł 4 – Temat Uzasadnienie Biznesowe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeznaczenie Tematu Uzasadnienie Biznesowe</li> <li>• Wynik, rezultat i korzyść</li> <li>• Rozwój Uzasadnienia Biznesowego</li> <li>• Uzasadnienie Biznesowe i Plan Przeglądu Korzyści</li> <li>• Pytania podsumowujące</li> <li>• Ćwiczenie – Wynik – Rezultat – Korzyść</li> </ul>
30 min	Przerwa
45 min	<p>Moduł 5 – Proces Inicjowanie Projektu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cel, przeznaczenie i kontekst procesu</li> <li>• Zakres procesu Inicjowanie Projektu</li> <li>• Pytania podsumowujące</li> </ul>
45 min	<p>Moduł 6 – Temat Plany:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeznaczenie Tematu Plany</li> <li>• Poziomy planów w PRINCE2</li> <li>• Podejście do planowania</li> <li>• Technika planowania produktowego</li> <li>• Pytania podsumowujące</li> <li>• Omówienie ćwiczenia – Produkty (do realizacji samodzielnie przed szkoleniem)</li> </ul>
15 min	Przerwa
75 min	<p>Moduł 7 – Temat Jakość:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeznaczenie Tematu Jakość</li> <li>• Planowanie jakości</li> <li>• Kontrola jakości</li> <li>• Nadzór jakości</li> <li>• Pytania podsumowujące</li> </ul> <p>Ćwiczenie – Jakość – ćwiczenie fakultatywne do samodzielnej realizacji</p>
<p>Praca domowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drugi próbny egzamin PRINCE2 Foundation wraz z wyjaśnieniami</li> </ul>	
<b>Dzień drugi</b>	
30 min	Omówienie wyników próbnych egzaminów PRINCE2 Foundation
60 min	<p>Moduł 8 – Temat Ryzyko:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeznaczenie Tematu Ryzyko</li> <li>• Procedura zarządzani ryzykiem</li> <li>• Wymagane zapisy – Rejestr Ryzyk</li> <li>• Pytania podsumowujące</li> <li>• Omówienie ćwiczenia – Ryzyko (do realizacji samodzielnie przed szkoleniem)</li> </ul>
30 min	<p>Moduł 9 – Proces Zarządzanie Końcem Etapu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cel, przeznaczenie i kontekst procesu</li> <li>• Zakres procesu Zarządzanie Końcem Etapu</li> <li>• Pytania podsumowujące</li> </ul>
15 min	Przerwa

## PRINCE2® - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

75 min	<p>Moduł 10 – Temat Postępy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeznaczenie Tematu Postępy</li> <li>• Etapy zarządcze w projekcie</li> <li>• Mechanizmy zarządzania w oparciu o tolerancje</li> <li>• Mechanizmy sterowania Komitetu Sterującego</li> <li>• Mechanizmy sterowania Kierownika Projektu</li> <li>• Mechanizmy sterowania zależne od czasu</li> <li>• Mechanizmy sterowania zależne od zdarzeń</li> <li>• Pytania podsumowujące</li> <li>• Ćwiczenie – Raporty</li> </ul>
30 min	<p>Moduł 11 – Proces Sterowanie Etapem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cel, przeznaczenie i kontekst procesu</li> <li>• Zakres procesu Sterowanie Etapem</li> <li>• Pytania podsumowujące</li> </ul>
30 min	Przerwa
75 min	<p>Moduł 12 – Temat Zmiana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeznaczenie Tematu Zmiana</li> <li>• Zagadnienia projektowe</li> <li>• Mechanizmy sterowania w zarządzaniu zagadnieniami i zmianami</li> <li>• Zarządzanie konfiguracją</li> <li>• Procedura sterowania zagadnieniami i zmianami</li> <li>• Procedura zarządzania konfiguracją</li> <li>• Pytania podsumowujące</li> </ul> <p>Ćwiczenie – Zagadnienia</p>
30 min	<p>Moduł 13 – Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cel, przeznaczenie i kontekst procesu</li> <li>• Zakres procesu Zarządzanie Dostarczaniem Produktów</li> <li>• Pytania podsumowujące</li> </ul>
15 min	Przerwa
30 min	<p>Moduł 14 – Proces Zamykanie Projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cel, przeznaczenie i kontekst procesu</li> <li>• Zakres procesu Zamykanie Projektu</li> <li>• Pytania podsumowujące</li> </ul> <p>„Piąta” decyzja strategiczna</p>
30 min	<p>Moduł 15 – Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cel, przeznaczenie i kontekst procesu</li> <li>• Zakres procesu Zarządzanie Strategiczne Projektem</li> <li>• Pytania podsumowujące</li> </ul>
10 min	Zakończenie szkolenia


## DLACZEGO PRINCE2®?

Z projektami mamy do czynienia codziennie, gdyż projekty to sposób na osiągnięcie zamierzonych celów. Projekt realizujemy budując dom, wprowadzając nowy produkt na rynek lub otwierając nowy oddział firmy. Bez względu na to, czy są to duże przedsięwzięcia, czy też złożone operacje, projekt to wysiłek podejmowany z myślą o realizacji celu w ograniczonym czasie i przy skończonych zasobach.

Udział w szkoleniu zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu, a także pomaga w kontrolowany sposób prowadzić projekt.

- ◆ PRINCE2 daje korzyści w postaci **kontroli zasobów** i efektywnej możliwości **zarządzania ryzykiem** biznesowym oraz ryzykiem projektu,
- ◆ PRINCE2 zawiera ustalone i sprawdzone **najlepsze praktyki zarządzania projektami**. Metodyka ta jest szeroko rozpowszechniona i rozumiana, dzięki czemu zapewnia wspólny język wszystkim uczestnikom projektu,
- ◆ PRINCE2 zachęca do formalnego uznania odpowiedzialności w projekcie i koncentruje się na tym, co projekt ma dostarczyć, dlaczego, kiedy, gdzie i dla kogo.

Szkolenie będzie odbywać się z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi przekazu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników:



## EKSPERCI

---

Trenerzy INPROGRESS to zespół **doświadczonych specjalistów**, których wiedzę z zakresu zarządzania potwierdzają zdobyte **akredytacje i lata doświadczeń** w środowisku biznesowym. Dzięki zawodowej aktywności, z łatwością obrazują teoretyczną wiedzę przykładami z codziennej pracy. Indywidualne podejście do każdego uczestnika szkoleń oraz wypracowany warsztat trenerski sprawiają, że sale szkoleniowe opuszczają wyłącznie zadowoleni kursanci!

Trener i manager z wieloletnią praktyką w biznesie i szkoleniach. Posiada doświadczenie na kierowniczych stanowiskach związane z zarządzaniem zespołami i kierowaniem projektami, działem serwisu oraz sprzedaży. Ma doświadczenie w zarządzaniu programami i portfelem zmian biznesowych w organizacji. Trener wiodący PRINCE2 (PRINCE2 Lead Trainer). Akredytowany trener metodyki PRINCE2, P30 oraz MSP. Projektuje i prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zarządzania projektami, programami, portfelem i zarządzania ryzykiem w projektach.



**Marcin Jackowski**



**Marcin Trendel**

Trener, wykładowca i manager z wieloletnią praktyką. Posiada doświadczenie na kierowniczych stanowiskach związanych z zarządzaniem nawet kilkudziesięcioosobowymi zespołami projektowymi oraz prowadzeniu kilku projektów jednocześnie. Zarządzał wieloma dużymi projektami z zakresu HR, finansów i nieruchomości. Na swoim koncie ma zrealizowany z sukcesem jeden z największych w Polsce projektów UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

## ADRESACI

---

- ◆ Obecni i przyszli kierownicy projektów,
- ◆ Uczestnicy zespołów realizujących projekty w organizacjach,
- ◆ Menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru projektu,
- ◆ Osoby, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą poznać standard zarządzania projektami PRINCE2,
- ◆ Osoby zarządzające projektami w ramach perspektywy UE na lata 2014-2020.

## KORZYŚCI

---

- ◆ Poznanie podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2, zaznajomienie się z metodyką i terminologią.
- ◆ Zdobywanie wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt wg PRINCE2.
- ◆ Poznanie schematu podejmowania decyzji w projekcie, dostosowanie metodyki do projektu i organizacji.

### **A w konsekwencji:**

- ◆ Niższe koszty wdrożenia strategii organizacji, dzięki skutecznej realizacji projektów, a także dzięki eliminacji tych projektów, które są nieuzasadnione biznesowo.
- ◆ Ograniczenie liczby nierentownych projektów, dzięki ich lepszemu i pełniejszemu przygotowaniu oraz ukierunkowanemu na uzasadnienie biznesowe.
- ◆ Większa przewidywalność oraz pełniejsza kontrola kosztów i harmonogramu realizowanych projektów, w tym umiejętne zmniejszenie liczby projektów przekraczających założony budżet i opóźniających się.
- ◆ Większa porównywalność projektów, możliwość wymiany doświadczeń i zastępowania kierowników projektów, dzięki jednolitemu sposobowi zarządzania projektami w całej organizacji.
- ◆ Stworzenie w uczestnikach szkolenia orientacji biznesowej i postawy właścicielskiej względem zarządzanych w organizacji projektów oraz nastawienie na efektywną komunikację.



# CERTYFIKACJA

---

Egzamin PRINCE2 Foundation daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu wydawanego przez międzynarodowego akredytora. Certyfikat jest **międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej** w zakresie stosowania metody PRINCE2 w zarządzaniu projektami i jest wydawany bezterminowo. Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim.

## TERMINY

---

Termin szkolenia – 7-8 czerwca 2018 r.

Godziny szkolenia – 8.00 – 16.00

Termin egzaminu Foundation zostanie ustalony w trakcie szkolenia w oparciu o sugestie uczestników.

## KOSZT/1 osoba

---

Cena certyfikowanego szkolenia: **850 zł/netto\***

Cena egzaminu PRINCE2® Foundation **850 zł/netto**.

Cena podręcznika: **270 zł/netto**.

\* Przy zgłoszeniu każdej kolejnej osoby z jednej organizacji udziela się **5%** rabatu od kosztu udziału drugiej i każdej kolejnej osoby.

Każdy uczestnik szkolenia w ramach poniesionych kosztów otrzymuje materiały szkoleniowe:

- ◆ wydruk materiałów
- ◆ zestawy ćwiczeniowe,
- ◆ scenariusze ćwiczeń,
- ◆ brudnopis na notatki,
- ◆ przykładowe egzaminy PRINCE2® Foundation.

## KONTAKT

---

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów organizacyjnych prosimy o kontakt z biurem spółki SPIN-US:

E-mail: [spin@us.edu.pl](mailto:spin@us.edu.pl)

Telefon: 32 359 20 79

## ZAPRASZAMY!

---

Udział w szkoleniu PRINCE2® to niepowtarzalna okazja do pogłębienia wiedzy i poszerzenia horyzontów myślowych w zakresie zarządzania projektami. Ukończenie szkolenia i pozytywne zdanie egzaminu, pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu, umożliwiającego w pełni profesjonalną działalność nad opracowywaniem własnego projektu, bez względu na jego zasięg. Zapewniamy, że wiedza i umiejętności przekazywane przez trenerów przełożą się na realne korzyści i efektywne zarządzanie w firmie.

**Podnieś swoją wartość na rynku pracy i zapisz się już dziś!**
